FITRAM	PRUEBA DE RESISTENCIA DE MALLA POR CAIDA DE POTENCIAL - PUESTA A TIERRA	MSTI-CST-ELB-PC-0002	
#VALUE! CSTM		Revisión	Número
		V0	1

DOCUMENTO DE REFERENCIA	REV.	PROCEDIMIENTO:	REV.	HORA	FECHA
MSTI-CST-ELB-MA-0001	V3	MANUAL DE PUESTA A TIERRA	V1	8:00 PM	4/14/2026

INFORMACIONES GENERALES

a) (X) Malla de puesta a tierra
b) (X) Malla de SPDA (Sist. De Protección de Desc. Atmosféricas)

Diámetro de las Varillas:	3/4¨ (Pulgadas)
Longitud de las Varillas:	10´ (Pies)
Sección transversal del cable (mm2):	107.2
Cantidad de Varillas de la Malla:	28


INSPECCION VISUAL, MECANICA Y ELECTRICA

a) (X)	Verificación de conectores de aterramiento	Estacion 3	Valor Promedio leído	0.170	(Ω).
b) (X)	Verificación de cables de empalmes		Valores de Aceptacion:		
c) (X)	Verificación continuidad eléctrica de la malla		*Para Resistencia de Malla: 5.0 Ohm (Ω)*	*Para Resistencia de Malla SPDA: 10.0 Ohm (Ω).*	

REGISTRO DE LA RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO

TABLA DE RESULTADOS

DISTANCIA EP		MEDICIONES	
% EP/EC	Metros	Ohms	Angulo
52%	10.40 Metros	0.160	180
52%	10.40 Metros	0.170	180
52%	10.40 Metros	0.160	180
62%	12.40 Metros	0.170	180
62%	12.40 Metros	0.180	180
62%	12.40 Metros	0.180	180
72%	14.40 Metros	0.200	180
72%	14.40 Metros	0.200	180
72%	14.40 Metros	0.200	180

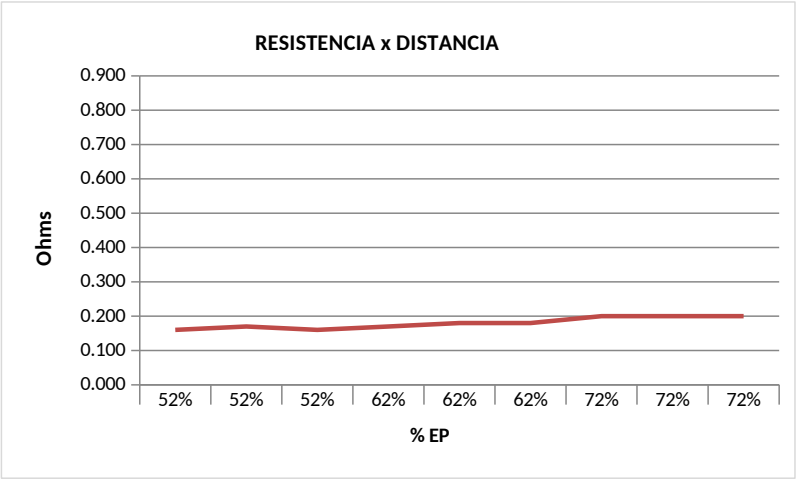

EP: Pica/Pinza de Potencial ; **EC**: Pica/Pinza de Corriente

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

TIPO: Comprobador de puesta a tierra	TIPO: N/A
ID equipo:	ID equipo: N/A
N°. SERIE:	N°. SERIE: N/A
N°. CERTIFICADO:	N°. CERTIFICADO: N/A
VALIDEZ:	VALIDEZ: N/A
RESULTADO DE LA MEDICION:	**TIPO DE SUELO:**
DECISIÓN:	(X) SECO
(**X**) APROBADO	( ) SEMI-HUMEDO
( ) REPROBADO	( ) HUMEDO

OBS:	TEMPERATURA AMBIENTE:	N/a	°C	HUMEDAD RELATIVA:	N/a	%

REALIZADO POR		VERFICADO POR		APROBADO POR	
Nombre		Nombre		Nombre	**Dino Salvucci**
Cargo		Cargo		Cargo	**Supervisión Técnica**
Representante de Instalaciones		**Representante de Calidad**		**Representante de Supervisión**	
