Liberación de Ambiente PDA

MSTI-SO

Versión
V0

Estación:		**Fecha:**		**Documentos referenciales:**
Plano:		**Versión:**		

Leyenda: A= Aceptado, ACR= Aceptado con PENDIENTES, R= Rechazado NA= No aplica

PDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONFORME	CONFORME CON RESERVAS	NO CONFORME
1	Se debe identificar el punto central o punto kilométrico georreferenciado (PK) que indique el centro del área de embarque en ambas plataformas de la estación.			
2	Las plataformas para la instalación del sistema PDA deben tener una superficie pulida y anivelada.			
3	El piso para la instalación de las PFAP debe tener una superficie pulida y anivelada.			
4	No deben existir cerámicas o azulejos próximos (mínimo 1 metro de distancia) al área de instalación de las PDA, PFAP y PCL.			
5	Toda el área de andén debe estar limpia y libre de obstáculos.			
6	**Verificación de medidas** 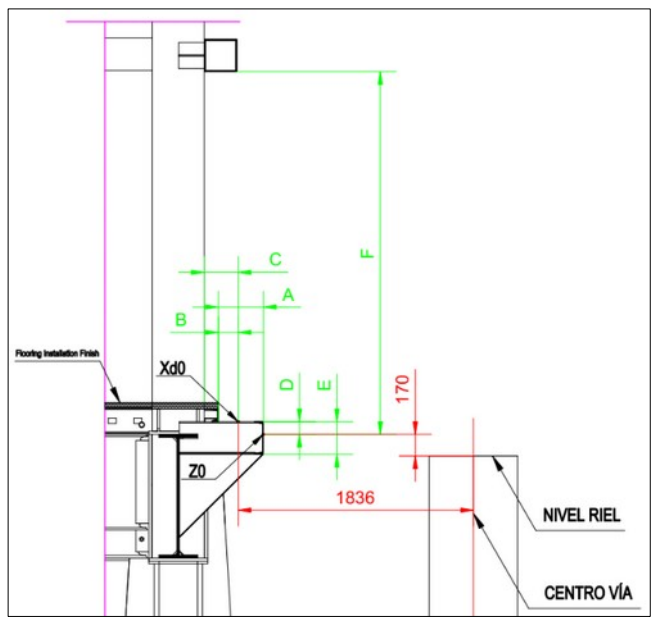 C A B F Flooring Installation Finish Xd0 D E 170 Z0 1836 NIVEL RIEL CENTRO VÍA Se deben de confirmar las siguientes medidas en cada una de las columnas estructurales que estarán en frente del sistema PDA (Columna C-02 a C-10). Medidas a confirmar según figura: Valor A: 350±5 mm Valor B: ≥154 mm Valor C: ≥264 mm Valor D: 100±5 mm Valor E: 257±10 mm Valor F: 2860±30 mm Medidas de referencia: Xd0: 1836mm (desde el centro de vía) Z0: 170mm (desde superficie de vía)			
7	Medidas a confirmar en **columna C-02 hasta columna C-10 (plataforma 01 y 02):** Valor A: 350±5 mm Valor B: ≥154 mm Valor C: ≥264 mm Valor D: 100±5 mm Valor E: 257±10 mm Valor F: 2860±30 mm			
8	Ambas plataformas o bordes para la instalación del sistema PDA deben tener una longitud mínima de 48,580mm (tomando como referencia el **punto central** del área de embarque; la medida del centro al lado izquierdo debe ser 24,290mm y la medida de centro al lado derecho debe ser 24,290mm).			
9	La altura de la viga superior sobre las PDA debe ser 2650±30mm sin considerar el piso acabado (considerando el piso acabado debe ser 2600±30mm). Esta altura se debe de medir desde el nivel de piso de andén hasta la cara inferior de la viga. Esta altura se debe de medir en las columnas estructurales de ambas plataformas **(Confirmar en columna C-02 hasta columna C-10) (plataforma 01y 02).**			
10	Debe de existir una separación de 914±5mm entre las columnas destinadas para las instalación de las **PFAP-01, 02, 03 y 04** (Esta separación se debe de validar en la parte inferior, intermedia y superior de las columnas).			
11	La altura de la viga superior sobre las PFAP debe ser 2650±30mm sin considerar el piso acabado (considerando el piso acabado debe ser 2600±30mm). Esta altura se debe de medir desde el nivel de piso de andén hasta la cara inferior de la viga. Esta altura se debe de medir del lado izquierdo y derecho de las columnas destinadas para la instalación de la **PFAP-01, 02, 03 y 04.**			
12	Debe existir una diferencia de 0±50mm entre el punto central o PK central del área de embarque y el centro de la columna estructural C-06 (plataforma 01 y 02).			
13	Debe existir una distancia de 23,731±50mm desde el punto central o PK central del área de embarque hasta el centro de la columna estructural C-02 (plataforma 01 y 02).			
14	Debe existir una distancia de 17,770±50mm desde el punto central o PK central del área de embarque hasta el centro de la columna estructural C-03 (plataforma 01 y 02).			
15	Debe existir una distancia de 11,847±50mm desde el punto central o PK central del área de embarque hasta el centro de la columna estructural C-04 (plataforma 01 y 02).			
16	Debe existir una distancia de 5,920±50mm desde el punto central o PK central del área de embarque hasta el centro de la columna estructural C-05 (plataforma 01 y 02).			
17	Debe existir una distancia de 5,922±50mm desde el punto central o PK central del área de embarque hasta el centro de la columna estructural C-07 (plataforma 01 y 02).			
18	Debe existir una distancia de 11,843±50mm desde el punto central o PK central del área de embarque hasta el centro de la columna estructural C-08 (plataforma 01 y 02).			
19	Debe existir una distancia de 17,766±50mm desde el punto central o PK central del área de embarque hasta el centro de la columna estructural C-09 (plataforma 01 y 02).			
20	Debe existir una distancia de 23,699±50mm desde el punto central o PK central del área de embarque hasta el centro de la columna estructural C-10 (plataforma 01 y 02).			

ESTATUS FINAL		
☐ ACEPTADO	☐ ACEPTADO CON RESERVAS	☐ RECHAZADO

PENDIENTES	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Elaborado por:		**Verificado por:**		**Verificado por:**		**Validado por:**		**Va**
CSTM - Instalaciones SOF		**CSTM - Calidad SOF**		**CSTM - Ingeniería SOF**		**CSTM - Estrella**		**Super**
Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:
Cargo:		Cargo:		Cargo:		Cargo:		Cargo:

F-CAL-FR-0001
Fecha
3/12/2026
NO APLICA

FECHA PREVISTA CIERRE DE PENDIENTES
alidado por:
rvisión Técnica
