FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA – MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

CSTM

Monorriel de Santiago
CONSORCIO CSTMS

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIÓN (IAT) DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS – FDS**
Codigo de documento:	**N/A**

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción de la Revisión	Ítems Revisados
VA	**10/12/2024**	**Versión Inicial**	**Todos**
VB	**06/11/2025**	**Actualización de tabla de conexionado y equipos ETP, para incluir cobertura de FDS en cuartos técnicos.**	**Equipos ETP Cableado ETP**

Elaborado por:	Verificado por:	Aprobado por:
César Medina Santos	Luis Garcia Hiraldo	Juan Camilo Romero
Función: Ingeniero	**Función: Coordinador de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyectos**
Fecha y Firma: 06/11/2025	**Fecha y Firma**: XX/11/2025	**Fecha y Firma:** XX/11/2025

Identificación de las sesiones de prueba (En caso de no culminar la sesión de prueba, esta debe cerrarse e iniciar una nueva)					
SESION 1	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 2	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 3	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 4	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 5	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 6	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				

PUNTOS PENDIENTES

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	SISTEMA FDS
Fecha:			
Inspector:			

Item	Lugar	Pendiente	Observación

FIRMAS DE PRESENTES

PRUEBAS				
LUGAR	**EQUIPOS**	**CABLEADO**	**INSTALACIÓN**	**COMENTARIOS**
Estación E01	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E02	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E03	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E04	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E05	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E06	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E07	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E08	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E09	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E10	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E11	Equipos Atípica	Cableado de energía Atípica	Instalación	
Estación E12	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E13	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
Estación E14	Equipos ETP	Cableado de energía ETP	Instalación	
CCO	Equipos CCO	Cableado de energía ETP	Instalación	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS – FDS

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			NIVEL ACERA	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	NIVEL EMBARQUE			
1		DETECTOR DE HUMO/ CALOR	2	2	1	2	14	DHMCA-001, DHMCA-002, DHMCA-003, DHMCA-004, DHMCA-005, DHMCA-006, DHMCA-007, DHMCA-008, DHMCA-009, DHMCA-010, DHMCA-011, DHMCA-012, DHMCA-013, DHMCA-014, DHMCA-015, DHMCA-016, DHMCA-017, DHMCA-018, DHMCA-019, DHMCA-020, DHMCA-021		
2		DETECTOR DE HUMO EN TECHO FALSO	0	0	0	0	2	DTHTF-001, DTHTF-002		
3		SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA	1	0	1	0	3	SIRLZ-001, SIRLZ-002, SIRLZ-003, SIRLZ-004, SIRLZ-005		
4		ACCIONADOR MANUAL	0	1	1	1	3	ACCMA-001, ACCMA-002, ACCMA-003, ACCMA-004, ACCMA-005, ACCMA-006		
5		MODULO DE CONTROL INTELIGENTE	0	0	0	1	4	MODCI-001, MODCI-002, MODCI-003, MODCI-004, MODCI-005		
6		CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS	0	0	0	0	1	CNTDI-001		
7		DETECTOR DE HUMO/ CALOR EN PISO TECNICO	N/A	N/A	N/A	2	2	DHCPT-001, DHCPT-002, DHCPT-003, DHCPT-004		
8		SIRENA DE LAZO LSN	N/A	1	N/A	1	1	SILSN-001, SILSN-002, SILSN-003		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS – FDS

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			NIVEL ACERA	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	NIVEL EMBARQUE			
1		DETECTOR DE HUMO/ CALOR							TBD	
2		DETECTOR DE HUMO SOBRE TECHO FALSO							TBD	
3		SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA							TBD	
4		ACCIONAMIENTO DOBLE MANUAL							TBD	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**CCO**
PLANO:		SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS – FDS

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
1		DETECTOR DE HUMO / CALOR	23	DHMCA-001 DHMCA-002 DHMCA-003 DHMCA-004 DHMCA-005 DHMCA-006 DHMCA-007 DHMCA-008 DHMCA-009 DHMCA-010 DHMCA-011 DHMCA-012 DHMCA-013 DHMCA-014 DHMCA-015 DHMCA-016 DHMCA-017 DHMCA-018 DHMCA-019 DHMCA-020 DHMCA-021 DHMCA-022 DHMCA-023		
2		DETECTOR DE HUMO / CALOR	23	DHMCA-024 DHMCA-025 DHMCA-026 DHMCA-027 DHMCA-028 DHMCA-029 DHMCA-030 DHMCA-031 DHMCA-032 DHMCA-033 DHMCA-034 DHMCA-035 DHMCA-036 DHMCA-037 DHMCA-038 DHMCA-039 DHMCA-040 DHMCA-041 DHMCA-042 DHMCA-043 DHMCA-044 DHMCA-045 DHMCA-046		

3		DETECTOR DE HUMO / CALOR	21	DHMCA-047 DHMCA-048 DHMCA-049 DHMCA-050 DHMCA-051 DHMCA-052 DHMCA-053 DHMCA-054 DHMCA-055 DHMCA-056 DHMCA-057 DHMCA-058 DHMCA-059 DHMCA-060 DHMCA-061 DHMCA-062 DHMCA-063 DHMCA-064 DHMCA-065 DHMCA-066 DHMCA-067		
4		DETECTOR DE HUMO SOBRE TECHO FALSO	14	DTHTF-001 DTHTF-002 DTHTF-003 DTHTF-004 DTHTF-005 DTHTF-006 DTHTF-007 DTHTF-008 DTHTF-009 DTHTF-010 DTHTF-011 DTHTF-012 DTHTF-013 DTHTF-014		
5		SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA	4	SIRLZ-001 SIRLZ-002 SIRLZ-003 SIRLZ-004		
6		ACCIONADOR MANUAL	5	ACCMA-001 ACCMA-002 ACCMA-003 ACCMA-004 ACCMA-005		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	SISTEMA FDS

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES





1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:	Se usará multímetro y cinta métrica como elementos de medición. Se usará una certificadora de red para el cableado Ethernet.		

2. Identificación del Sitio

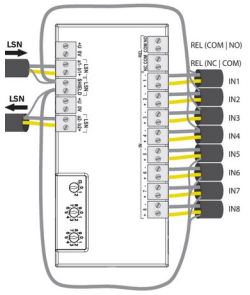
Item	Referencia	Observaciones
Sitio		

3. Inspección visual de la instalación de los cables y canalizaciones



Item	OK/NOK	Observaciones
Correcta conexión en los bornes de las bases de los detectores de humo y con el módulo de lazo LSN 0300A. Ver referencia en la siguiente figura 		
Verificar la integridad en el aislamiento (dentro de las cajas de paso) de los cables de positivo y negativo tanto del lazo LSN como del ramal de las sirenas, evitando contactos indeseados con las carcasa de la caja de paso.		
Inspeccionar que haya una buena conexión en los bornes de los equipos. Para una buena conexión se toma en cuenta que la totalidad de los hilos conductores del cable estén aprisionados por el contacto metálico del equipo, sin dejar hilos sueltos.		
Verificar que el conexionado de las sirenas estroboscópicas se encuentre como la imagen a continuación. Inicia desde el módulo NAC continuando por cada sirena definida en el ramal de notificación, y finalmente se conecta la resistencia de final de línea. También se verifica que la entrada de voltaje auxiliar de 24Vdc se hace desde una salida auxiliar del Módulo de control de baterías (BCM). La conexión de lazo LSN debe estar correcta, entrando por LSN 1 y saliendo por LSN 2. 		
La central de incendio y la central remota debe estar conectada en sus respectivo puertos de CAN1 para cada equipo. 		
Revisar el conexionado del accionamiento manual se encuentra en los bornes correctos, como se referencia en la imagen. 		
Revisar que los conectores de bus CAN de los rieles se encuentren debidamente conectados. El orden es el siguiente: De la central se conecta en la entrada del riel corto PRS 0002 A, de esa salida se conecta a la entrada del riel largo PRS 0004 A y de la salida del mismo se contecta el terminal CAN (incluido en el empaque del PRS 0004 A).		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	SISTEMA FDS

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

En los bornes de entradas del módulo inteligente, verificar si se encuentran correctamente conectados los periféricos asignados, en la imagen de referencia se puede observar la conexión de las entradas. 		
La polaridad en la conexión de los bornes de los equipos se respeta, estando bajo las siguientes consideraciones: - Para el lazo LSN el negativo entra y sale en la letra "a", el positivo entra y sale en la letra "b". - Para el lazo de las sirenas es el caso contrario, el negativo se conecta en "b" y el positivo en "a".		
Verificar que el calibre del cable alimentación auxiliar del módulo NAC sea máximo 16 AWG o su equivalente.		

4. Inspección visual de los equipos

Item	OK/NOK	Observaciones
Adecuada fijación y posición de los detectores de humo, la señal que tiene el equipo debe coincidir con el de la base del detector de humo, tal como se muestra a continuación. 		
El panel de detección de incendio debe incluir todos los componentes que son necesarios para el sistema y se encuentren en su respectiva ubicación . 		
En cada equipo direccionable (detectores, accionadores manuales, módulo de control, módulo NAC) se debe observar que la dirección se encuentre designada correctamente. Para los detectores de humo/calor, la dirección física es la misma que la asignada en la secuencia del plano. Para los demás dispositivos seguirán secuencialmente en el siguiente orden: Detectores sobre techo falso, detectores bajo piso técnico, accionadores manuales, módulos de control, módulo NAC.		
Adecuada ubicación de los equipos de acuerdo a lo especificado en los planos de la localidad que se está inspeccionando.		
Aspectos generales a verificar: - Calidad de la instalación (fijación, conectores, acabado global) - Equipo identificado con etiquetas definitivas y las mismas son las correctas. - Cables están conectados al equipo y a su destino. (Acorde a documento de tabla de conexionado).		

5. Decisión

Prueba	Decisión	Observaciones / Firma
Resultado de la prueba OK / NOK		

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	SISTEMA FDS

CABLEADO DE CONTROL CIRCUITO SLC

INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)										FIN DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)				
ÍTEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	DESIGNACIÓN	LOCALIZACIÓN	SISTEMA	ORIGEN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	FIN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2
1	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SEG	FDS	CNTDI-001	LSN 0300	LSN1	[CNTDI-001/LSN 0300/LSN1]/MODCI-004/LSN1	SEG	N/A	MODCI-004	LSN1	[MODCI-004/LSN1]/CNTDI-001LSN 0300/LSN1
2	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SEG	FDS	N/A	MODCI-004	LSN2	[MODCI-004/LSN2]/DHMCA-014	SEG	N/A	DHMCA-014	N/A	[DHMCA-014]/MODCI-004/LSN2
3	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SEG	FDS	N/A	DHMCA-014	N/A	[SEG/DHMCA-014]/ZNP/MODCI-005/LSN1	ZNP	N/A	MODCI-005	LSN1	[ZNP/MODCI-005/LSN1]/SEG/DHMCA-014
4	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	ZNP	FDS	N/A	MODCI-005	LSN2	[ZNP/MODCI-005/LSN2]/ESC/DHMCA-015	ESC	N/A	DHMCA-015	N/A	[ESC/DHMCA-015]/ZNP/MODCI-005/LSN2
5	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	ESC	FDS	N/A	DHMCA-015	N/A	[ESC/DHMCA-015]/ZNP/ACCMA-003	ZNP	N/A	ACCMA-003	N/A	[ZNP/ACCMA-003]/ESC/DHMCA-015
6	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	AND	FDS	N/A	ACCMA-003	N/A	[AND/ACCMA-003]/ZNP/DHMCA-013	ZNP	N/A	DHMCA-013	N/A	[ZNP/DHMCA-013]/AND/ACCMA-003
7	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	ZNP	FDS	N/A	DHMCA-013	N/A	[ZNP/DHMCA-013]/ZPA/MODCI-003/LSN1	ZPA	N/A	MODCI-003	LSN1	[ZPA/MODCI-003/LSN1]/ZNP/DHMCA-013
8	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	ZPA	FDS	N/A	MODCI-003	LSN2	[MODCI-003/LSN2]/DHMCA-012	ZPA	N/A	DHMCA-012	N/A	[DHMCA-012]/MODCI-003/LSN2
9	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	ZPA	FDS	N/A	DHMCA-012	N/A	[DHMCA-012]/DHMCA-011	ZPA	N/A	DHMCA-011	N/A	[DHMCA-011]/DHMCA-012
10	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	ZPA	FDS	N/A	DHMCA-011	N/A	[DHMCA-011]/DHMCA-010	ZPA	N/A	DHMCA-010	N/A	[DHMCA-010]/DHMCA-011
11	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	ZPA	FDS	N/A	DHMCA-010	N/A	[DHMCA-010]/DHMCA-009	ZPA	N/A	DHMCA-009	N/A	[DHMCA-009]/DHMCA-010
12	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	ZPA	FDS	N/A	DHMCA-009	N/A	[DHMCA-009]/DHMCA-008	ZPA	N/A	DHMCA-008	N/A	[DHMCA-008]/DHMCA-009
13	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	ZPA	FDS	N/A	DHMCA-008	N/A	[DHMCA-008]/DHMCA-007	ZPA	N/A	DHMCA-007	N/A	[DHMCA-007]/DHMCA-008
14	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	ZPA	FDS	N/A	DHMCA-007	N/A	[ZPA/DHMCA-007]/ASC/DHMCA-006	ASC	N/A	DHMCA-006	N/A	[ASC/DHMCA-006]/ZPA/DHMCA-007
15	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	ASC	FDS	N/A	DHMCA-006	N/A	[ASC/DHMCA-006]/PA-2/MODCI-002/LSN1	PA-2	N/A	MODCI-002	LSN1	[PA-2/MODCI-002/LSN1]/ASC/DHMCA-006
16	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA-2	FDS	N/A	MODCI-002	LSN2	[MODCI-002/LSN2]/ACCMA-002	PA-2	N/A	ACCMA-002	N/A	[ACCMA-002]/MODCI-002/LSN2
17	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA-2	FDS	N/A	ACCMA-002	N/A	[PA-2/ACCMA-002]/ENF/DHMCA-005	ENF	N/A	DHMCA-005	N/A	[ENF/DHMCA-005]/PA-2/ACCMA-002
18	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	ENF	FDS	N/A	DHMCA-005	N/A	[DHMCA-005]/DTHTF-001	ENF	N/A	DTHTF-001	N/A	[DTHTF-001]/DHMCA-005
19	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	ENF	FDS	N/A	DTHTF-001	N/A	[ENF/DTHTF-001]/SEN/DHCPT-003	SEN	N/A	DHCPT-003	N/A	[SEN/DHCPT-003]/ENF/DTHTF-001
20	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SEN	FDS	N/A	DHCPT-003	N/A	[DHCPT-003]/DHCPT--004	SEN	N/A	DHCPT--004	N/A	[DHCPT--004]/DHCPT-003
21	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SEN	FDS	N/A	DHCPT--004	N/A	[DHCPT--004]/ACCMA-006	SEN	N/A	ACCMA-006	N/A	[ACCMA-006]/DHCPT--004
22	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SEN	FDS	N/A	ACCMA-006	N/A	[ACCMA-006]/SILSN-003	SEN	N/A	SILSN-003	N/A	[SILSN-003]/ACCMA-006
23	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SEN	FDS	N/A	SILSN-003	N/A	[SILSN-003]/DHMCA-020	SEN	N/A	DHMCA-020	N/A	[DHMCA-020]/SILSN-003
24	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SEN	FDS	N/A	DHMCA-020	N/A	[DHMCA-020]/DHMCA-021	SEN	N/A	DHMCA-021	N/A	[DHMCA-021]/DHMCA-020
25	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SEN	FDS	N/A	DHMCA-021	N/A	[DHMCA-021]/DTHTF-002	SEN	N/A	DTHTF-002	N/A	[DTHTF-002]/DHMCA-021
26	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SEN	FDS	N/A	DTHTF-002	N/A	[SEN/DTHTF-002]/PA-3/DHMCA-004	PA-3	N/A	DHMCA-004	N/A	[PA-3/DHMCA-004]/SEN/DTHTF-002
27	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA-3	FDS	N/A	DHMCA-004	N/A	[PA-3/DHMCA-004]/SCO/DHCPT-002	SCO	N/A	DHCPT-002	N/A	[SCO/DHCPT-002]/PA-3/DHMCA-004
28	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SCO	FDS	N/A	DHCPT-002	N/A	[DHCPT-002]/DHCPT-001	SCO	N/A	DHCPT-001	N/A	[DHCPT-001]/DHCPT-002
29	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SCO	FDS	N/A	DHCPT-001	N/A	[DHCPT-001]/MODCI-001/LSN1	SCO	N/A	MODCI-001	LSN1	[MODCI-001/LSN1]/DHCPT-001
30	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SCO	FDS	N/A	MODCI-001	LSN2	[MODCI-001/LSN2]/DHMCA-019	SCO	N/A	DHMCA-019	N/A	[DHMCA-019]/MODCI-001/LSN2
31	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SCO	FDS	N/A	DHMCA-019	N/A	[DHMCA-019]/DHMCA-018	SCO	N/A	DHMCA-018	N/A	[DHMCA-018]/DHMCA-019
32	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SCO	FDS	N/A	DHMCA-018	N/A	[DHMCA-018]/SILSN-002	SCO	N/A	SILSN-002	N/A	[SILSN-002]/DHMCA-018
33	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SCO	FDS	N/A	SILSN-002	N/A	[SILSN-002]/ACCMA-005	SCO	N/A	ACCMA-005	N/A	[ACCMA-005]/SILSN-002
34	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SCO	FDS	N/A	ACCMA-005	N/A	[SCO/ACCMA-005]/SBT/DHMCA-017	SBT	N/A	DHMCA-017	N/A	[SBT/DHMCA-017]/SCO/ACCMA-005
35	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SBT	FDS	N/A	DHMCA-017	CH2	[DHMCA-017/CH2]/SILSN-001	SBT	N/A	SILSN-001	N/A	[SILSN-001]/DHMCA-017/CH2
36	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SBT	FDS	N/A	SILSN-001	N/A	[SILSN-001]/ACCMA-004	SBT	N/A	ACCMA-004	N/A	[ACCMA-004]/SILSN-001
37	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SBT	FDS	N/A	ACCMA-004	N/A	[ACCMA-004]/DHMCA-016	SBT	N/A	DHMCA-016	N/A	[DHMCA-016]/ACCMA-004
38	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SBT	FDS	N/A	DHMCA-016	N/A	[SBT/DHMCA-016]/EEM/ACCMA-001	EEM	N/A	ACCMA-001	N/A	[EEM/ACCMA-001]/SBT/DHMCA-016
39	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	EEM	FDS	N/A	ACCMA-001	N/A	[EEM/ACCMA-001]/SM2/DHMCA-003	SM2	N/A	DHMCA-003	N/A	[SM2/DHMCA-003]/EEM/ACCMA-001
40	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SM2	FDS	N/A	DHMCA-003	N/A	[SM2/DHMCA-003]/SBO/DHMCA-001	SBO	N/A	DHMCA-001	N/A	[SBO/DHMCA-001]/SM2/DHMCA-003
41	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SBO	FDS	N/A	DHMCA-001	N/A	[SBO/DHMCA-001]/SNA/DHMCA-002	SNA	N/A	DHMCA-002	N/A	[SNA/DHMCA-002]/SBO/DHMCA-001
42	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SNA	FDS	N/A	DHMCA-002	N/A	[SNA/DHMCA-002]/SEG/FLM-420-NAC/LSN1	SEG	N/A	FLM-420-NAC	LSN1	[SEG/FLM-420-NAC/LSN1]/SNA/DHMCA-002
43	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SEG	FDS	N/A	FLM-420-NAC	N/A	[FLM-420-NAC]/CNTDI-001/LSN 0300/LSN2	SEG	CNTDI-001	LSN 0300	LSN2	[CNTDI-001/LSN 0300/LSN2]/FLM-420-NAC

CABLEADO DE CONTROL CIRCUITO NAC

INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)										FIN DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)				
ÍTEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	DESIGNACIÓN	LOCALIZACIÓN	SISTEMA	ORIGEN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	FIN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2
1	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	RAMAL NAC	SEG	FDS	N/A	FLM-420 NAC	OUT	[SEG/FLM-420 NAC/OUT]/ZPA/SIRLZ-005	ZPA	N/A	SIRLZ-005	N/A	[ZPA/SIRLZ-005]/SEG/FLM-420 NAC/OUT
2	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	RAMAL NAC	ZPA	FDS	N/A	SIRLZ-005	N/A	[SIRLZ-005]/SIRLZ-004	ZPA	N/A	SIRLZ-004	N/A	[SIRLZ-004]/SIRLZ-005
3	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	RAMAL NAC	ZPA	FDS	N/A	SIRLZ-004	N/A	[ZPA/SIRLZ-004]/PA-2/SIRLZ-003	PA-2	N/A	SIRLZ-003	N/A	[PA-2/SIRLZ-003]/ZPA/SIRLZ-004
4	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	RAMAL NAC	PA-2	FDS	N/A	SIRLZ-003	N/A	[PA-2/SIRLZ-003]/EEM/SIRLZ-002	EEM	N/A	SIRLZ-002	N/A	[EEM/SIRLZ-002]/PA-2/SIRLZ-003
5	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	RAMAL NAC	EEM	FDS	N/A	SIRLZ-002	N/A	[EEM/SIRLZ-002]/PA-1/SIRLZ-001	PA-1	N/A	SIRLZ-001	N/A	[PA-1/SIRLZ-001]/EEM/SIRLZ-002
6	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	RAMAL NAC	PA-1	FDS	N/A	SIRLZ-001	N/A	[SIRLZ-001]/RFLNC-001	PA-1	N/A	RFLNC-001	N/A	[RFLNC-001]/SIRLZ-001

TABLA DE CABLEADO A INTERFAZ CON RIS

INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)										FIN DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)				
ÍTEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	DESIGNACIÓN	LOCALIZACIÓN	SISTEMA	ORIGEN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	FIN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2
1	CABLE UTP	CONEXIÓN CON RIS	CONEXIÓN CON RIS	SEG	FDS	N/A	CNTDI-001	N/A	[CNTDI-001]/COF-01	SEG	N/A	COF-01	N/A	[COF-01]/CNTDI-001

TABLA DE CABLEADO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)										FIN DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)				
ÍTEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	DESIGNACIÓN	LOCALIZACIÓN	SISTEMA	ORIGEN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	FIN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2
1	CABLE ELÉCTRICO (3x4mm^2)	RZ1-K AS+	ALIMENTACIÓN BTR	SEG	FDS	N/A	TSNAN-001	-X10	[TSNAN-001/-X10]/CNTDI-001	SEG	N/A	CNTDI-001	N/A	[CNTDI-001]/TSNAN-001/-X10

FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA — MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA — OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

CSTM

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	SISTEMA FDS

CABLEADO DE CONTROL CIRCUITO SLC

INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)										FIN DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)				
ÍTEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	DESIGNACIÓN	LOCALIZACIÓN	SISTEMA	ORIGEN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	FIN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE CABLEADO DE ENERGÍA

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	SISTEMA FDS

CABLEADO DE CONTROL CIRCUITO SLC

INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)										FIN DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)				
ÍTEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	DESIGNACIÓN	LOCALIZACIÓN	SISTEMA	ORIGEN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	FIN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2
1	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO08	FDS	CNTDI-001	LSN 0300	LSN1	FDS[CO08/CNTDI-001/LSN 0300/LSN1]/CO21/DHMCA-040	CO21	N/A	DHMCA-040	N/A	FDS[CO21/DHMCA-040]/CO08/CNTDI-001/LSN 0300/LSN1
2	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO21	FDS	N/A	DHMCA-040	N/A	FDS[CO21/DHMCA-040]/PA01/DHMCA-030	PA01	N/A	DHMCA-030	N/A	FDS[PA01/DHMCA-030]/CO21/DHMCA-040
3	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA01	FDS	N/A	DHMCA-030	N/A	FDS[DHMCA-030]/DHMCA-029	PA01	N/A	DHMCA-029	N/A	FDS[DHMCA-029]/DHMCA-030
4	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA01	FDS	N/A	DHMCA-029	N/A	FDS[DHMCA-029]/DHMCA-020	PA01	N/A	DHMCA-020	N/A	FDS[DHMCA-020]/DHMCA-029
5	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA01	FDS	N/A	DHMCA-020	N/A	FDS[DHMCA-020]/DHMCA-010	PA01	N/A	DHMCA-010	N/A	FDS[DHMCA-010]/DHMCA-020
6	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA01	FDS	N/A	DHMCA-010	N/A	FDS[DHMCA-010]/ACCMA-001	PA01	N/A	ACCMA-001	N/A	FDS[ACCMA-001]/DHMCA-010
7	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA01	FDS	N/A	ACCMA-001	N/A	FDS[PA01/ACCMA-001]/CO01/DHMCA-001	CO01	N/A	DHMCA-001	N/A	FDS[CO01/DHMCA-001]/PA01/ACCMA-001
8	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO01	FDS	N/A	DHMCA-001	N/A	FDS[DHMCA-001]/DHMCA-008	CO01	N/A	DHMCA-008	N/A	FDS[DHMCA-008]/DHMCA-001
9	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO01	FDS	N/A	DHMCA-008	N/A	FDS[CO01/DHMCA-008]/CTVW1/DHMCA-009	CTVW1	N/A	DHMCA-009	N/A	FDS[CTVW1/DHMCA-009]/CO01/DHMCA-008
10	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CTVW1	FDS	N/A	DHMCA-009	N/A	FDS[CTVW1/DHMCA-009]/PA01/ACCMA-002	PA01	N/A	ACCMA-002	N/A	FDS[PA01/ACCMA-002]/CTVW1/DHMCA-009
11	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA01	FDS	N/A	ACCMA-002	N/A	FDS[PA01/ACCMA-002]/CO01/DHMCA-002	CO01	N/A	DHMCA-002	N/A	FDS[CO01/DHMCA-002]/PA01/ACCMA-002
12	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO01	FDS	N/A	DHMCA-002	N/A	FDS[DHMCA-002]/DHMCA-007	CO01	N/A	DHMCA-007	N/A	FDS[DHMCA-007]/DHMCA-002
13	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO01	FDS	N/A	DHMCA-007	N/A	FDS[DHMCA-007]/DHMCA-003	CO01	N/A	DHMCA-003	N/A	FDS[DHMCA-003]/DHMCA-007
14	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO01	FDS	N/A	DHMCA-003	N/A	FDS[DHMCA-003]/DHMCA-006	CO01	N/A	DHMCA-006	N/A	FDS[DHMCA-006]/DHMCA-003
15	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO01	FDS	N/A	DHMCA-006	N/A	FDS[DHMCA-006]/DHCPT-001	CO01	N/A	DHCPT-001	N/A	FDS[DHCPT-001]/DHMCA-006
16	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO01	FDS	N/A	DHCPT-001	N/A	FDS[DHCPT-001]/DHCPT-002	CO01	N/A	DHCPT-002	N/A	FDS[DHCPT-002]/DHCPT-001
17	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO01	FDS	N/A	DHCPT-002	N/A	FDS[CO01/DHCPT-002]/CO02/DHCPT-003	CO02	N/A	DHCPT-003	N/A	FDS[CO02/DHCPT-003]/CO01/DHCPT-002
18	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO02	FDS	N/A	DHCPT-003	N/A	FDS[DHCPT-003]/DHMCA-005	CO02	N/A	DHMCA-005	N/A	FDS[DHMCA-005]/DHCPT-003
19	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO02	FDS	N/A	DHMCA-005	N/A	FDS[DHMCA-005]/DHMCA-004	CO02	N/A	DHMCA-004	N/A	FDS[DHMCA-004]/DHMCA-005
20	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO02	FDS	N/A	DHMCA-004	N/A	FDS[DHMCA-004]/DTHTF-001	CO02	N/A	DTHTF-001	N/A	FDS[DTHTF-001]/DHMCA-004
21	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO02	FDS	N/A	DTHTF-001	N/A	FDS[CO02/DTHTF-001]/PA02/DHMCA-015	PA02	N/A	DHMCA-015	N/A	FDS[PA02/DHMCA-015]/CO02/DTHTF-001
22	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA02	FDS	N/A	DHMCA-015	N/A	FDS[DHMCA-015]/DHMCA-014	PA02	N/A	DHMCA-014	N/A	FDS[DHMCA-014]/DHMCA-015
23	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA02	FDS	N/A	DHMCA-014	N/A	FDS[DHMCA-014]/DHMCA-017	PA02	N/A	DHMCA-017	N/A	FDS[DHMCA-017]/DHMCA-014
24	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA02	FDS	N/A	DHMCA-017	N/A	FDS[PA02/DHMCA-017]/CO05/DHMCA-016	CO05	N/A	DHMCA-016	N/A	FDS[CO05/DHMCA-016]/PA02/DHMCA-017
25	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO05	FDS	N/A	DHMCA-016	N/A	FDS[DHMCA-016]/DTHTF-002	CO05	N/A	DTHTF-002	N/A	FDS[DTHTF-002]/DHMCA-016
26	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO05	FDS	N/A	DTHTF-002	N/A	FDS[CO05/DTHTF-002]/PA02/ACCMA-003	PA02	N/A	ACCMA-003	N/A	FDS[PA02/ACCMA-003]/CO05/DTHTF-002
27	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA02	FDS	N/A	ACCMA-003	N/A	FDS[PA02/ACCMA-003]/SC03/DHMCA-018	SC03	N/A	DHMCA-018	N/A	FDS[SC03/DHMCA-018]/PA02/ACCMA-003
28	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SC03	FDS	N/A	DHMCA-018	N/A	FDS[DHMCA-018]/DTHTF-003	SC03	N/A	DTHTF-003	N/A	FDS[DTHTF-003]/DHMCA-018
29	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SC03	FDS	N/A	DTHTF-003	N/A	FDS[SC03/DTHTF-003]/CO01/DHMCA-012	CO01	N/A	DHMCA-012	N/A	FDS[CO01/DHMCA-012]/SC03/DTHTF-003
30	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO01	FDS	N/A	DHMCA-012	N/A	FDS[DHMCA-012]/DHMCA-013	CO01	N/A	DHMCA-013	N/A	FDS[DHMCA-013]/DHMCA-012
31	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO01	FDS	N/A	DHMCA-013	N/A	FDS[CO01/DHMCA-013]/CO04/DHMCA-019	CO04	N/A	DHMCA-019	N/A	FDS[CO04/DHMCA-019]/CO01/DHMCA-013
32	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO04	FDS	N/A	DHMCA-019	N/A	FDS[CO04/DHMCA-019]/CO03/DHMCA-011	CO03	N/A	DHMCA-011	N/A	FDS[CO03/DHMCA-011]/CO04/DHMCA-019
33	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO03	FDS	N/A	DHMCA-011	N/A	FDS[CO03/DHMCA-011]/CO06/DHMCA-023	CO06	N/A	DHMCA-023	N/A	FDS[CO06/DHMCA-023]/CO03/DHMCA-011
34	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO06	FDS	N/A	DHMCA-023	N/A	FDS[DHMCA-023]/DTHTF-006	CO06	N/A	DTHTF-006	N/A	FDS[DTHTF-006]/DHMCA-023
35	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO06	FDS	N/A	DTHTF-006	N/A	FDS[CO06/DTHTF-006]/PA03/DHMCA-024	PA03	N/A	DHMCA-024	N/A	FDS[PA03/DHMCA-024]/CO06/DTHTF-006
36	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA03	FDS	N/A	DHMCA-024	N/A	FDS[PA03/DHMCA-024]/SC04/DHMCA-022	SC04	N/A	DHMCA-022	N/A	FDS[SC04/DHMCA-022]/PA03/DHMCA-024
37	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SC04	FDS	N/A	DHMCA-022	N/A	FDS[DHMCA-022]/DTHTF-005	SC04	N/A	DTHTF-005	N/A	FDS[DTHTF-005]/DHMCA-022
38	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SC04	FDS	N/A	DTHTF-005	N/A	FDS[SC04/DTHTF-005]/CO07/DHMCA-026	CO07	N/A	DHMCA-026	N/A	FDS[CO07/DHMCA-026]/SC04/DTHTF-005
39	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO07	FDS	N/A	DHMCA-026	N/A	FDS[CO07/DHMCA-026]/SC04/DHMCA-021	SC04	N/A	DHMCA-021	N/A	FDS[SC04/DHMCA-021]/CO07/DHMCA-026
40	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SC04	FDS	N/A	DHMCA-021	N/A	FDS[DHMCA-021]/DTHTF-004	SC04	N/A	DTHTF-004	N/A	FDS[DTHTF-004]/DHMCA-021
41	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	SC04	FDS	N/A	DTHTF-004	N/A	FDS[SC04/DTHTF-004]/CO07/DHMCA-027	CO07	N/A	DHMCA-027	N/A	FDS[CO07/DHMCA-027]/SC04/DTHTF-004
42	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO07	FDS	N/A	DHMCA-027	N/A	FDS[CO07/DHMCA-027]/CO22/MODCI-001/LSN1	CO22	N/A	MODCI-001	LSN1	FDS[CO22/MODCI-001/LSN1]/CO07/DHMCA-027
43	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO22	FDS	N/A	MODCI-001	LSN2	FDS[CO22/MODCI-001/LSN2]/CO07/DHMCA-028	CO07	N/A	DHMCA-028	N/A	FDS[CO07/DHMCA-028]/CO22/MODCI-001/LSN2
44	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO07	FDS	N/A	DHMCA-028	N/A	FDS[CO07/DHMCA-028]/PA02/DHMCA-025	PA02	N/A	DHMCA-025	N/A	FDS[PA02/DHMCA-025]/CO07/DHMCA-028
45	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA02	FDS	N/A	DHMCA-025	N/A	FDS[PA02/DHMCA-025]/CO10/DHMCA-035	CO10	N/A	DHMCA-035	N/A	FDS[CO10/DHMCA-035]/PA02/DHMCA-025
46	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO10	FDS	N/A	DHMCA-035	N/A	FDS[DHMCA-035]/DTHTF-007	CO10	N/A	DTHTF-007	N/A	FDS[DTHTF-007]/DHMCA-035
47	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO10	FDS	N/A	DTHTF-007	N/A	FDS[CO10/DTHTF-007]/PA03/DHMCA-034	PA03	N/A	DHMCA-034	N/A	FDS[PA03/DHMCA-034]/CO10/DTHTF-007
48	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA03	FDS	N/A	DHMCA-034	N/A	FDS[DHMCA-034]/ACCMA-004	PA03	N/A	ACCMA-004	N/A	FDS[ACCMA-004]/DHMCA-034
49	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA03	FDS	N/A	ACCMA-004	N/A	FDS[PA03/ACCMA-004]/CO09/DHMCA-033	CO09	N/A	DHMCA-033	N/A	FDS[CO09/DHMCA-033]/PA03/ACCMA-004
50	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO09	FDS	N/A	DHMCA-033	N/A	FDS[DHMCA-033]/DTHTF-008	CO09	N/A	DTHTF-008	N/A	FDS[DTHTF-008]/DHMCA-033
51	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO09	FDS	N/A	DTHTF-008	N/A	FDS[CO09/DTHTF-008]/CO08/DHMCA-038	CO08	N/A	DHMCA-038	N/A	FDS[CO08/DHMCA-038]/CO09/DTHTF-008
52	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO08	FDS	N/A	DHMCA-038	N/A	FDS[CO08/DHMCA-038]/PA03/DHMCA-037	PA03	N/A	DHMCA-037	N/A	FDS[PA03/DHMCA-037]/CO08/DHMCA-038
53	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA03	FDS	N/A	DHMCA-037	N/A	FDS[PA03/DHMCA-037]/CTVW2/DHMCA-039	CTVW2	N/A	DHMCA-039	N/A	FDS[CTVW2/DHMCA-039]/PA03/DHMCA-037
54	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CTVW2	FDS	N/A	DHMCA-039	N/A	FDS[DHMCA-039]/MODCI-004/LSN1	CTVW2	N/A	MODCI-004	LSN1	FDS[MODCI-004/LSN1]/DHMCA-039
55	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CTVW2	FDS	N/A	MODCI-004	LSN2	FDS[CTVW2/MODCI-004/LSN2]/CO08/DHMCA-031	CO08	N/A	DHMCA-031	N/A	FDS[CO08/DHMCA-031]/CTVW2/MODCI-004/LSN2
56	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO08	FDS	N/A	DHMCA-031	N/A	FDS[DHMCA-031]/DHMCA-032	CO08	N/A	DHMCA-032	N/A	FDS[DHMCA-032]/DHMCA-031
57	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO08	FDS	N/A	DHMCA-032	N/A	FDS[DHMCA-032]/DHCPT-004	CO08	N/A	DHCPT-004	N/A	FDS[DHCPT-004]/DHMCA-032

58	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO08	FDS	N/A	DHCPT-004	N/A	FDS[CO08/DHCPT-004]/CO11/DHMCA-036	CO11	N/A	DHMCA-036	N/A	FDS[CO11/DHMCA-036]/CO08/DHCPT-004
59	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO11	FDS	N/A	DHMCA-036	N/A	FDS[DHMCA-036]/DTHTF-009	CO11	N/A	DTHTF-009	N/A	FDS[DTHTF-009]/DHMCA-036
60	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO11	FDS	N/A	DTHTF-009	N/A	FDS[CO11/DTHTF-009]/CO12/DHMCA-045	CO12	N/A	DHMCA-045	N/A	FDS[CO12/DHMCA-045]/CO11/DTHTF-009
61	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO12	FDS	N/A	DHMCA-045	N/A	FDS[DHMCA-045]/DTHTF-010	CO12	N/A	DTHTF-010	N/A	FDS[DTHTF-010]/DHMCA-045
62	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO12	FDS	N/A	DTHTF-010	N/A	FDS[CO12/DTHTF-010]/CO13/DHMCA-046	CO13	N/A	DHMCA-046	N/A	FDS[CO13/DHMCA-046]/CO12/DTHTF-010
63	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO13	FDS	N/A	DHMCA-046	N/A	FDS[DHMCA-046]/DTHTF-011	CO13	N/A	DTHTF-011	N/A	FDS[DTHTF-011]/DHMCA-046
64	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO13	FDS	N/A	DTHTF-011	N/A	FDS[CO13/DTHTF-011]/CO14/DHMCA-050	CO14	N/A	DHMCA-050	N/A	FDS[CO14/DHMCA-050]/CO13/DTHTF-011
65	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO14	FDS	N/A	DHMCA-050	N/A	FDS[CO14/DHMCA-050]/PA03/DHMCA-049	PA03	N/A	DHMCA-049	N/A	FDS[PA03/DHMCA-049]/CO14/DHMCA-050
66	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA03	FDS	N/A	DHMCA-049	N/A	FDS[DHMCA-049]/DHMCA-048	PA03	N/A	DHMCA-048	N/A	FDS[DHMCA-048]/DHMCA-049
67	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA03	FDS	N/A	DHMCA-048	N/A	FDS[DHMCA-048]/DHMCA-047	PA03	N/A	DHMCA-047	N/A	FDS[DHMCA-047]/DHMCA-048
68	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA03	FDS	N/A	DHMCA-047	N/A	FDS[DHMCA-047]/DHMCA-044	PA03	N/A	DHMCA-044	N/A	FDS[DHMCA-044]/DHMCA-047
69	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA03	FDS	N/A	DHMCA-044	N/A	FDS[PA03/DHMCA-044]/PCI/DHMCA-043	PCI	N/A	DHMCA-043	N/A	FDS[PCI/DHMCA-043]/PA03/DHMCA-044
70	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PCI	FDS	N/A	DHMCA-043	N/A	FDS[DHMCA-043]/DHMCA-042	PCI	N/A	DHMCA-042	N/A	FDS[DHMCA-042]/DHMCA-043
71	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PCI	FDS	N/A	DHMCA-042	N/A	FDS[PCI/DHMCA-042]/CO21/DHMCA-041	CO21	N/A	DHMCA-041	N/A	FDS[CO21/DHMCA-041]/PCI/DHMCA-042
72	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO21	FDS	N/A	DHMCA-041	N/A	FDS[CO21/DHMCA-041]/PA03/DHMCA-051	PA03	N/A	DHMCA-051	N/A	FDS[PA03/DHMCA-051]/CO21/DHMCA-041
73	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA03	FDS	N/A	DHMCA-051	N/A	FDS[PA03/DHMCA-051]/CO14/DHMCA-052	CO14	N/A	DHMCA-052	N/A	FDS[CO14/DHMCA-052]/PA03/DHMCA-051
74	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO14	FDS	N/A	DHMCA-052	N/A	FDS[CO14/DHMCA-052]/CT01/DHMCA-053	CT01	N/A	DHMCA-053	N/A	FDS[CT01/DHMCA-053]/CO14/DHMCA-052
75	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CT01	FDS	N/A	DHMCA-053	N/A	FDS[CT01/DHMCA-053]/COM/MODCI-003/LSN1	COM	N/A	MODCI-003	LSN1	FDS[COM/MODCI-003/LSN1]/CT01/DHMCA-053
76	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	COM	FDS	N/A	MODCI-003	LSN2	FDS[COM/MODCI-003/LSN2]/CO19/DHMCA-059	CO19	N/A	DHMCA-059	N/A	FDS[CO19/DHMCA-059]/COM/MODCI-003/LSN2
77	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO19	FDS	N/A	DHMCA-059	N/A	FDS[DHMCA-059]/DTHTF-012	CO19	N/A	DTHTF-012	N/A	FDS[DTHTF-012]/DHMCA-059
78	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO19	FDS	N/A	DTHTF-012	N/A	FDS[DTHTF-012]/DHMCA-058	CO19	N/A	DHMCA-058	N/A	FDS[DHMCA-058]/DTHTF-012
79	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO19	FDS	N/A	DHMCA-058	N/A	FDS[CO19/DHMCA-058]/CO16/DHMCA-057	CO16	N/A	DHMCA-057	N/A	FDS[CO16/DHMCA-057]/CO19/DHMCA-058
80	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO16	FDS	N/A	DHMCA-057	N/A	FDS[CO16/DHMCA-057]/CO17/DHMCA-067	CO17	N/A	DHMCA-067	N/A	FDS[CO17/DHMCA-067]/CO16/DHMCA-057
81	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO17	FDS	N/A	DHMCA-067	N/A	FDS[DHMCA-067]/DTHTF-014	CO17	N/A	DTHTF-014	N/A	FDS[DTHTF-014]/DHMCA-067
82	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO17	FDS	N/A	DTHTF-014	N/A	FDS[CO17/DTHTF-014]/PA05/DHMCA-061	PA05	N/A	DHMCA-061	N/A	FDS[PA05/DHMCA-061]/CO17/DTHTF-014
83	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA05	FDS	N/A	DHMCA-061	N/A	FDS[PA05/DHMCA-061]/CO18/DHMCA-060	CO18	N/A	DHMCA-060	N/A	FDS[CO18/DHMCA-060]/PA05/DHMCA-061
84	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO18	FDS	N/A	DHMCA-060	N/A	FDS[CO18/DHMCA-060]/CO17/DHMCA-066	CO17	N/A	DHMCA-066	N/A	FDS[CO17/DHMCA-066]/CO18/DHMCA-060
85	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO17	FDS	N/A	DHMCA-066	N/A	FDS[CO17/DHMCA-066]/PA05/DHMCA-062	PA05	N/A	DHMCA-062	N/A	FDS[PA05/DHMCA-062]/CO17/DHMCA-066
86	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA05	FDS	N/A	DHMCA-062	N/A	FDS[PA05/DHMCA-062]/CO16/DHMCA-056	CO16	N/A	DHMCA-056	N/A	FDS[CO16/DHMCA-056]/PA05/DHMCA-062
87	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO16	FDS	N/A	DHMCA-056	N/A	FDS[DHMCA-056]/DTHTF-013	CO16	N/A	DTHTF-013	N/A	FDS[DTHTF-013]/DHMCA-056
88	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO16	FDS	N/A	DTHTF-013	N/A	FDS[CO16/DTHTF-013]/PA05/DHMCA-063	PA05	N/A	DHMCA-063	N/A	FDS[PA05/DHMCA-063]/CO16/DTHTF-013
89	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	PA05	FDS	N/A	DHMCA-063	N/A	FDS[PA05/DHMCA-063]/CO15/DHMCA-064	CO15	N/A	DHMCA-064	N/A	FDS[CO15/DHMCA-064]/PA05/DHMCA-063
90	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO15	FDS	N/A	DHMCA-064	N/A	FDS[DHMCA-064]/DHMCA-055	CO15	N/A	DHMCA-055	N/A	FDS[DHMCA-055]/DHMCA-064
91	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO15	FDS	N/A	DHMCA-055	N/A	FDS[DHMCA-055]/DHMCA-054	CO15	N/A	DHMCA-054	N/A	FDS[DHMCA-054]/DHMCA-055
92	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO15	FDS	N/A	DHMCA-054	N/A	FDS[DHMCA-054]/DHMCA-065	CO15	N/A	DHMCA-065	N/A	FDS[DHMCA-065]/DHMCA-054
93	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO15	FDS	N/A	DHMCA-065	N/A	FDS[CO15/DHMCA-065]/CO08/MODCI-002/LSN1	CO08	N/A	MODCI-002	LSN1	FDS[CO08/MODCI-002/LSN1]/CO15/DHMCA-065
94	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO08	FDS	N/A	MODCI-002	LSN2	FDS[MODCI-002/LSN2]/FLM-420 NAC/LSN1	CO08	N/A	FLM-420 NAC	LSN1	FDS[FLM-420 NAC/LSN1]/MODCI-002/LSN2
95	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	LAZO SLC	CO08	FDS	N/A	FLM-420 NAC	LSN2	FDS/FLM-420 NAC/LSN2]/CNTDI-002/LSN 0300/LSN2	CO08	CNTDI-002	LSN 0300	LSN2	FDS[CNTDI-002/LSN 0300/LSN2]/FLM-420 NAC/LSN2

CABLEADO DE CONTROL CIRCUITO NAC

INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)										FIN DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)				
ÍTEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	DESIGNACIÓN	LOCALIZACIÓN	SISTEMA	ORIGEN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	FIN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2
1	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	RAMAL NAC	CO08	FDS	N/A	FLM-420 NAC	OUT	FDS[CO08/FLM-420 NAC/OUT]/PA01/SIRLZ-001	PA01	N/A	SIRLZ-001	N/A	FDS[PA01/SIRLZ-001]/CO08/FLM-420 NAC/OUT
2	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	RAMAL NAC	PA01	FDS	N/A	SIRLZ-001	N/A	FDS[PA01/SIRLZ-001]/PA02/SIRLZ-002	PA02	N/A	SIRLZ-002	N/A	FDS[PA02/SIRLZ-002]/PA01/SIRLZ-001
3	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	RAMAL NAC	PA02	FDS	N/A	SIRLZ-002	N/A	FDS[PA02/SIRLZ-002]/PA03/SIRLZ-003	PA03	N/A	SIRLZ-003	N/A	FDS[PA03/SIRLZ-003]/PA02/SIRLZ-002
4	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	RAMAL NAC	PA03	FDS	N/A	SIRLZ-003	N/A	FDS[PA03/SIRLZ-003]/CO18/SIRLZ-004	CO18	N/A	SIRLZ-004	N/A	FDS[CO18/SIRLZ-004]/PA03/SIRLZ-003
5	CABLE DE FDS (2x1.5mm^2)	FR SOZ1-K AS+	RAMAL NAC	CO18	FDS	N/A	SIRLZ-004	N/A	FDS[SIRLZ-004]/RFLNC-001	CO18	N/A	RFLNC-001	N/A	FDS[RFLNC-001]/SIRLZ-004

TABLA DE CABLEADO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)										FIN DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)				
ÍTEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	DESIGNACIÓN	LOCALIZACIÓN	SISTEMA	ORIGEN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	FIN	EQUIPO DE CONEXIÓN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2
1	CABLE DE RED	F/UTP CAT 6A	INTERFAZ RIS	CO08	FDS	CNTDI-001	FPE-2000-PPC	ETH 4	FDS[CO08/CNTDI-001/FPE-2000-PPC/ETH 4]/COM/ARM-09/GWFDS-01/LAN 1	COM	ARM-09	GWFDS-01	LAN 1	FDS[COM/ARM-09/GWFDS-01/LAN 1]/CO08/CNTDI-001/FPE-2000-PPC/ETH 4

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	SISTEMA FDS

VERIFICACION DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CABLES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:			

2. Configuración de la herramienta prueba

Parámetro	Referencia	Observaciones
Cable libre de halógenos		
Tensión de servicio		

3. Valores de Aceptación de las pruebas - Continuidad entre extremos del cable

Punto	Comentarios	Observaciones

4. Mediciones

VER ANEXO: RESULTADOS DE MEDIDAS/CALIBRACIÓN DEL EQUIPO O ITEM

5. Decisión

Prueba	Decisión	Observación / Firma
Mapa de conexiones OK / NOK		
Resultado de la prueba OK / NOK		
